


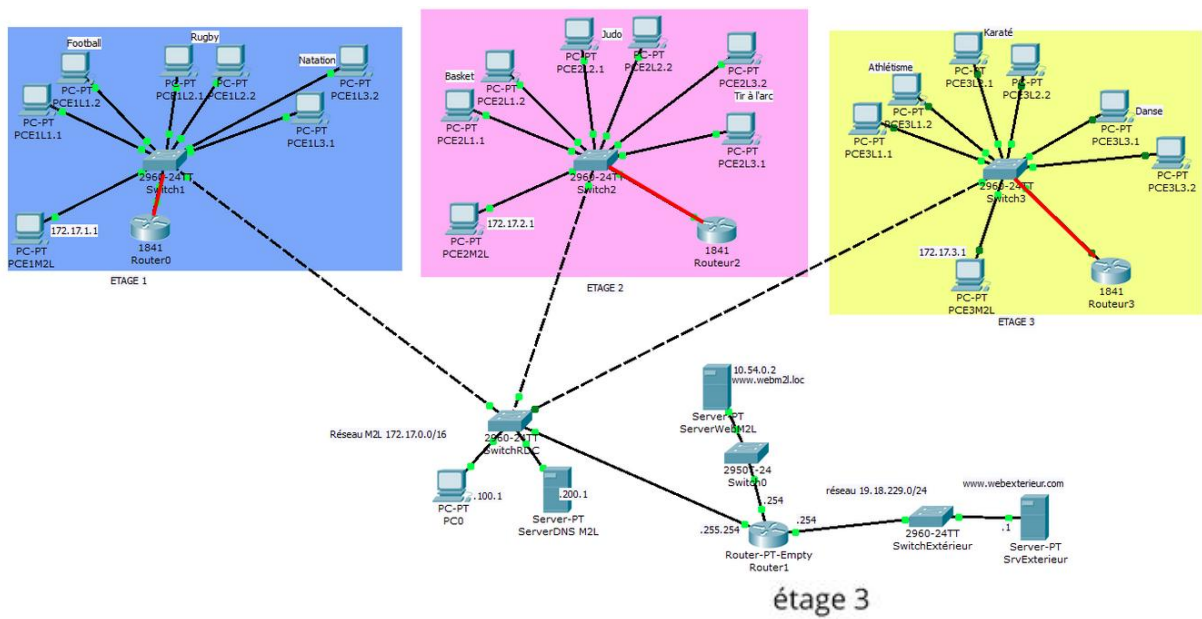

M2L

Trunk

étage 2

étage 1

Rez de chaussée

Réseau	Adresse de réseau	N° de VLAN	Commentaire	Adresse IP du routeur pour accéder au réseau M2L
M2L	172.17.0.0/16	8	Réparti sur tous les étages	/
Football	172.18.10.0/24	10	Ligues du premier étage	172.17.1.254
Rugby	172.18.20.0/24	20		
Natation	172.18.30.0/24	30		
Basket	172.18.40.0/24	40	Ligues du deuxième étage	172.17.2.254
Judo	172.18.50.0/24	50		
Tir à l'arc	172.18.60.0/24	60		
Athlétisme	172.18.70.0/24	70	Ligues du troisième étage	172.17.3.254
Karaté	172.18.80.0/24	80		
Danse	172.18.90.0/24	90		

Travail à faire		Date prévues
QUOI	QUI	
Mission 1 – Plan d'adressage	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Conception des VLANs	Commun	Le 26/09
Mission 1 – Config Etage1	Gaetan	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage2	Matis	Du 26/09 au 10/10
Mission 1 – Config Etage3	Malcolm	Du 26/09 au 10/10
Mission 2 – Documentation de la solution	Commun	Du 10/10 au 10/10
Mission 2 – Config Etage1	Gaetan	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage2	Matis	Du 10/10 au 17/10
Mission 2 – Config Etage3	Malcolm	Du 10/10 au 17/10
Mission 3 - Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Correspondances des noms d'interface	Gaetan	Le 7/11
Mission 3 - Créez le schéma de câblage physique	Matis	Le 7/11
Mission 3 – Config Etage3	Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage2	Matis	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config Etage1	Malcolm	Du 14/11 au 19/12
Mission 3 – Config RDC	Malcolm & Gaetan	Du 14/11 au 19/12
Mission 4 - limiter les attaques DHCP	Gaetan	Du 19/12 au 20/03/2026
Mission 4 - limiter les attaques VLAN	Malcolm	Du 19/12 au 20/03/2026
Mission 4 - limiter les attaques MAC	Matis	Du 19/12 au 20/03/2026

Couleur de texte **en bleu** : Avance de la date prévisionnelle
Couleur de texte **en rouge** : Retard de la date prévisionnelle
Texte surligné en vert : réussi

Raison pour le délais de la configuration de la mission 1 :
On a travaillé sur la mission 2 avant de finir la première. Ce qui nous a mis en retard.

Raison pour le délais de la configuration de la mission 3 - config :
On a eu une formation ce qui a empêcher l'avancement de la mission la semaine dernière
Le NAT ne fonctionnait pas
Un autre TP a été fait à la place du projet.
Il nous manquait la connexion vers l'extérieur.

Raison pour le délais de la mission 4 :
Le stage et les vacances.
